



実 施 工 程 管 理 図 表

工事名	概要		階数		延面積		床面積		契約工期		H25.11.5		請負金額									
	新築		5階		建築面積		3,367.55 m <sup>2</sup>		H24.10.22 ~		H25.11.5		61,250,000 円									
工事科目	工事金額	構成率	出来高	出来高	計画	実施	計画	実施	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
	税込(千円)	%	計画	%	%	%	10月	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
内部給水設備	1,837.5	3.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メータ一室内給水設備	4,287.5	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内部排水設備	9,249.0	15.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
各戸給排水衛生給湯換気設備	25,357.5	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外部給水設備	796.0	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外部排水設備	1,225.0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
給湯器設備	10,290.0	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
都市ガス設備	8,207.5	13.40	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	61,250.0	100.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.40	2.14	4.80	8.99	29.47	41.56	72.22	88.81	100.00	100.00

出来高欄の記入方法  
 上段：工種別出来高率  
 下段：工種別出来高率×構成率

※ 予定：----- 実施：——

現場代理人 鈴木 一滋





# 工事月別報告書 ( 1 月 )


[ 124 -

900029 ]

工事名		県営大和住宅2号棟新築機械設備工事								
工事場所		栃木県宇都宮市大和2丁目								
出来高	計画	0.31	%	作成日	平成24年10月30日					
	実施	0.00	%	担当者	星 淳一郎 <span style="float: right;">(印)</span>					
				請負業者名	和田工業株式会社					
				現場代理人	鈴木 一滋 <span style="float: right;">(印)</span>					
日	天気	作業内容		人工	日	天気	作業内容		人工	
1 (火)	◎	年末年始休暇			16 (水)	○	準備・書類作成			
2 (水)	○	年末年始休暇			17 (木)	●	準備・書類作成			
3 (木)	○	年末年始休暇			18 (金)	○	準備・書類作成			
4 (金)	○	年末年始休暇			19 (土)	○	準備・書類作成			
5 (土)	○	年末年始休暇			20 (日)	○				
6 (日)	○	年末年始休暇			21 (月)	●	準備・書類作成			
7 (月)	○	準備・書類作成			22 (火)	◎	準備・書類作成			
8 (火)	○	準備・書類作成			23 (水)	○	準備・書類作成			
9 (水)	○	準備・書類作成			24 (木)	○	準備・書類作成			
10 (木)	○	準備・書類作成			25 (金)	○	準備・書類作成			
11 (金)	○	第3回定例会議			26 (土)	○	準備・書類作成			
12 (土)	○	準備・書類作成			27 (日)	○				
13 (日)	○				28 (月)	○	準備・書類作成			
14 (月)	◇	準備・書類作成			29 (火)	○	第6回定例会議 準備・書類作成			
15 (火)	○	第5回定例会議 準備・書類作成			30 (水)	○	準備・書類作成			
					31 (木)	○	準備・書類作成			
備考		凡例 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>晴れ ○</span> <span>曇り ◎</span> <span>雨 ●</span> <span>雪 ◇</span> </div>								

# 工事状況写真

1

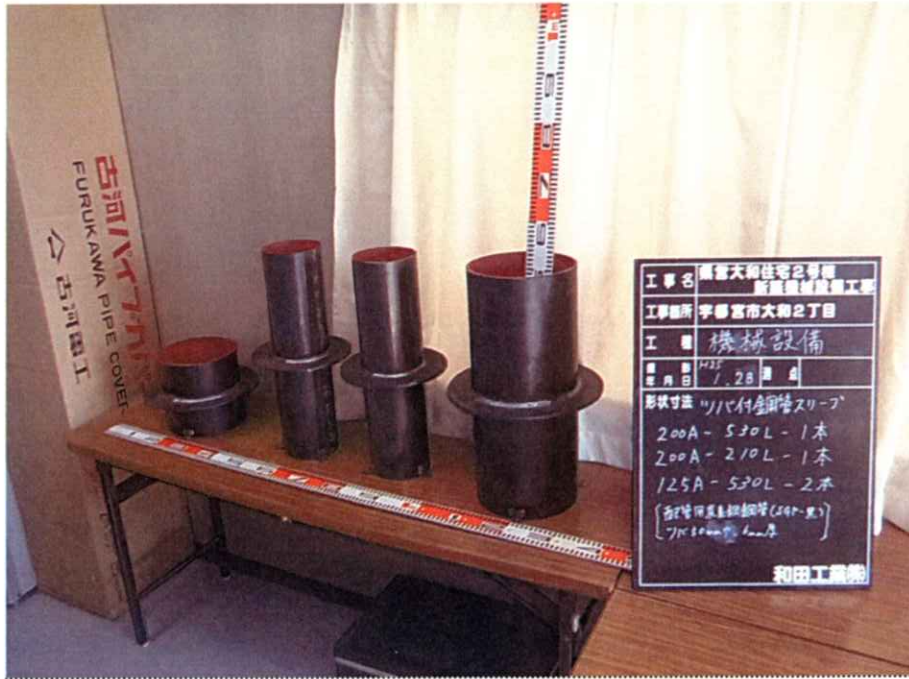

No.1

撮影日:H25. 1. 28

2



No.2

撮影日:H25. 1. 29
